


Relatório de acompanhamento de Projetos

Projetos Estratégicos

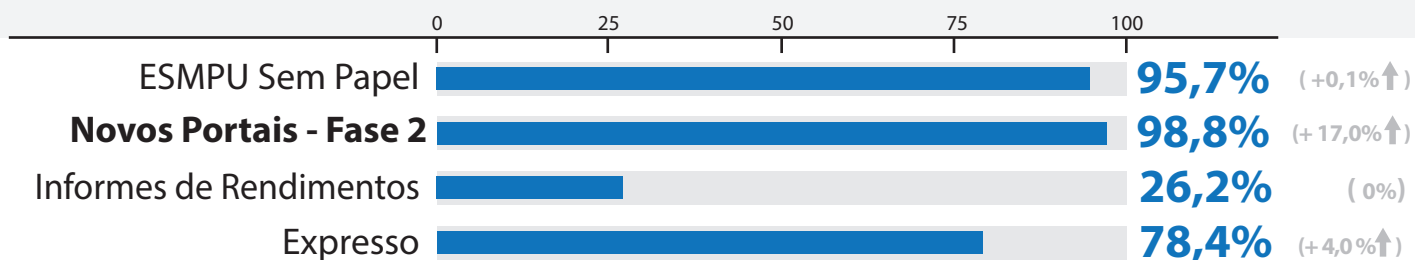

Projetos Setoriais

Diretoria Geral

Mapeamento dos processos da ESMPU  **59,8%**

Secretaria de Planejamento e Projetos

Recursos audiovisuais

Gestão da Prática Docente

Secretaria de Administração

Sempre Melhor

Capacitação de Gestores

Gestão Arquivística

Secretaria de Tecnologia da Informação

PDTI 2017

Política uso dos recursos de TI

Reestruturação do servidor de autenticação AD

Estruturação do Centro de Suporte

System Center

Revisão das políticas de grupo (GPOs) no AD

Secretaria de Infraestrutura e Logística Educacional

-

Projetos Estratégicos

ESMPU Sem Papel

Gerente: Flávia Azevedo


Execução Física

Tempo de vida do projeto

95,7% (+0,1%↑)

29/03/2016

meses de duração do projeto



06/09/2017

Término alterado

O projeto tem como objeto a implantação do processo eletrônico no âmbito da Escola Superior do Ministério Público da União, por meio do uso do Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

Exec. %	Fase	Data Final
100%	1. Planejamento do Projeto	29/08/2016
100%	2. Gestão da mudança organizacional	06/04/2017
100%	3. Desenvolvimento do processo-piloto	04/11/2016
99%	5. Configuração e parametrização do SEI	06/03/2017
100%	4. Desenvolvimento de Processo Regulatório, Normativo e de Trabalho	06/03/2017
100%	6. Suporte e Sustentação do SEI	17/03/2017
46%	7. Encerramento do projeto	06/09/2017

Percentual alterado

Término alterado



A atividade está paralisada por determinação do Diretor-Geral.

A equipe do projeto aguarda as conclusões sobre a necessidade de troca dos scanners adquiridos para iniciar a realização da atividade 7.1.

Indicadores

Última atualização dos indicadores: 28/06/2017



PLANEJAMENTO DO PROJETO




GESTÃO DA MUDANÇA ORGANIZACIONAL



DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS-PILOTO




DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO REGULATÓRIO, NORMATIVO E DE TRABALHO




CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SEI



SUORTE E SUSTENTAÇÃO DO SEI



ENCERRAMENTO DO PROJETO



PORCENTAGEM DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA PROPOSTO

Novos Portais - Fase 2

Gerente: Dulciane Florencio

Execução Física

Tempo de vida do projeto

98,7% (+ 17,0%↑)

11/04/2017

meses de duração do projeto



25/07/2017

Solicitação de Mudança - Portaria ESMPU 1035/2017

A criação de um novo portal na Intranet. Para isso, será desenvolvido um estudo para organizar e hierarquizar as informações e para criar um layout mais atrativo, de forma a facilitar a visualização dos conteúdos (principalmente o acesso aos sistemas e às informações de uso constante dos usuários).

Exec. %	Fase	Data Final
100%	Planejamento	05/05/2017
100%	Monitoramento e controle	25/07/2017
100%	Construção da Release	30/06/2017
100%	Produção	30/06/2017
100%	Lançamento	07/07/2017
70%	Treinamento e Encerramento	25/07/2017

Indicadores

Última atualização dos indicadores: 25/07/2017



ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA



PERCENTUAL DE AÇÃO DO ESCOPO



NÚMERO DE RISCOS NÃO RELACIONADOS

Projetos Estratégicos

Informes de Rendimentos

Gerente: Joaquim Paula

08/08/2016

meses de duração do projeto

Execução Física

Tempo de vida do projeto

26,23% (0%↑)

14/12/2017

Automatizar e padronizar o processo de emissão de informe de rendimentos.

Data Final

Exec. % Fase

100% ● 1. Planejamento

08/08/2016

20% ▸ 2. Construção

12/12/2017

0% ○ 4. Acompanhamento do Projeto

15/12/2017

0% ○ 3. Transição

14/12/2017

Indicadores

Não cadastrado

Última atualização dos indicadores: Não houve

Expresso

Gerente: Renata Mendes

06/09/2016

meses de duração do projeto

Execução Física

Tempo de vida do projeto

78,4% (+ 4,0%↑)

06/10/2017

Automatizar os processos de avaliação e controle de frequência nas atividades acadêmicas da ESMPU.

Exec. % Fase

Data Final

100% ● Planejamento

06/09/2016

60% ◐ Execução

28/09/2017

100% ● Redesenho do processo de trabalho (atualização)

21/10/2016

66% ◐ Automação do controle de frequência

17/07/2017

45% ◐ Avaliação das etapas anteriores implementadas

16/01/2017

83% ◐ Automação da avaliação

26/07/2017

22% ◐ Automação da certificação


28/09/2017

0% ○ Encerramento

06/10/2017

Indicadores

Última atualização dos indicadores: 24/07/2017



PERCENTUAL DE
ENTREGAS
DENTRO DO
PRAZO



PERCENTUAL DE
MUDANÇA NO
ESCOPO



PERCENTUAL DE
RISCOS NÃO
RELACIONADOS AO
PROJETO

Brasília, DF

27 de julho de 2017
