



Escola Superior do
Ministério Público da União

Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI

RELATÓRIO CONSOLIDADO DE EXECUÇÃO

FECHAMENTO DO 2º TRIMESTRE DE 2025

2024 - 2025

INTRODUÇÃO

2T25: ABRIL A JUNHO DE 2025



O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é o instrumento que orienta o diagnóstico, o planejamento e a gestão dos recursos e projetos de TI, com o objetivo de atender às necessidades tecnológicas e de informação do órgão em um período determinado. A Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) aprovou o PDTI 2024-2025, conforme registrado na ATA STI/ASDROJ/NUPROJ - 0485485, constante do Processo SEI 0.01.000.1.001406/2024-87.

O monitoramento dos projetos previstos no PDTI é conduzido pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), por meio do Núcleo de Projetos de Tecnologia da Informação (NUPROJ). Trimestralmente, é elaborado e divulgado um relatório consolidado, que apresenta o andamento dos projetos e um demonstrativo dos principais resultados e indicadores de desempenho.

Por fim, este documento tem por finalidade apresentar o acompanhamento da execução dos projetos do PDTI 2024-2025, o monitoramento das contratações conduzidas pela STI e a evolução dos indicadores estratégicos. Além disso, detalha o cronograma do portfólio de projetos, considerando as revisões e prioridades realizadas em conjunto com as Secretarias e em alinhamento com os direcionamentos estratégicos institucionais.

PROCESSOS

PESSOAS



TECNOLOGIA

Figura 1: Banner comemorativo dos 25 anos da ESMPU



STI - Projetos

2T25: ABRIL A JUNHO DE 2025



O conjunto de projetos apresentados no PDTI reflete as necessidades identificadas e priorizadas pela instituição. As revisões e avaliações do PDTI costumam demandar a reavaliação de prioridades e o balanceamento do portfólio, o que frequentemente implica o remanejamento de projetos de TI para alinhar-se aos novos direcionamentos estratégicos.

Nesta revisão, o ciclo de monitoramento corresponde ao encerramento do 2º trimestre de 2025, dentro do escopo do PDTI 2024-2025. Atualmente, a execução dos projetos pode ser acompanhada de forma dinâmica e interativa por meio do Portfólio de Projetos (BI de projetos), disponível na Intranet.

A figura 2 apresenta o quantitativo de projetos por situação registrado nesse ciclo.

Figura 2. PDTI 2024-25: Projetos por Situação - 2T25.



STI - Projetos

2T25: ABRIL A JUNHO DE 2025



Distribuição dos projetos

Situação atual:

- ✓ Concluídos: 43,75% - 7 projetos
- Em andamento: 50% - 8 projetos
- A iniciar: Nenhum projeto
- Atrasado: 6,25% - 1 projeto

Histórico recente

Na última revisão (1º trimestre de 2025):

- ⊘ 1 projeto foi cancelado, com justificativa documentada no 1T25.
- + 3 projetos foram adicionados no 1T25.
- + 1 novo projeto foi incluído nesta revisão de 2T25.
- + 5 projetos foram concluídos no 1T25 e 2 no ano de 2024.

Execução consolidada do portfólio

Considerando os 16 projetos em execução.
O percentual consolidado de execução do portfólio da STI é de: 71% concluído

Figura 3. PDTI 2024-25 -Portfólio de Projetos.

Projeto	Progresso
PS-STI-2025-02 - Migração de licenças da solução de virtualização	34%
PS-STI-2025-04 - Atualização do SEI	22%
PS-STI-2025-03 - Ensino Híbrido Unificado	68%
PS-STI-2024-17 - Gestão da continuidade, com foco no plano de recuperação e desastre	66%
PS-STI-2024-21 - Renovação do parque de computadores (desktops e notebooks)	71%
PS-STI-2024-19 - Implementação do novo NGFW	11%
PS-STI-2024-16 - Terceirização do suporte ao usuário de TI	60%
PS-STI-2024-07 - Renovação de infraestrutura de rede e datacenter	86%
PS-STI-2025-01 - Implantação do processo de gestão e fiscalização dos contratos de TI com foco na gestão de riscos	25%
PS-STI-2024-15 - Treinamento PowerBI	100%
PS-STI-2024-13 - Integração das bases de dados de Atividades da ESMPU	100%
PS-STI-2024-10 - Implementação da Fitoteca	100%
PS-STI-2024-18 - Aprimoramento do controle dos contratos de TI	100%
PS-STI-2024-08 - Readequação e expansão da solução de balanceamento de carga e tratamento de dados	100%
PS-STI-2024-06 - Contratação dos Certificados Digitais.	100%
PS-STI-2023-15 - Contratação do ORACLE	100%
Total	71%

Monitoramento Execução

2T25: ABRIL A JUNHO DE 2025



PROJETOS STI 2024-2025



EM ANDAMENTO

1. PS-STI-2025-02 - Migração de licenças da solução de virtualização - Em andamento- (34%)
2. PS-STI-2025-04 - Atualização do SEI - Em andamento - (22%)
3. PS-STI-2025-03 - Ensino Híbrido Unificado- Em andamento - (68%)
4. PS-STI-2024-17 - Gestão da continuidade, com foco no plano de recuperação e desastre - Em andamento - (66%)
5. PS-STI-2024-21 - Renovação do parque de computadores (desktops e notebooks) - Atrasado- (71%)
6. PS-STI-2024-19 - Implementação do novo NGFW - Em andamento - (11%)
7. PS-STI-2024-16 - Terceirização do suporte ao usuário de TI - Em andamento - (60%)
8. PS-STI-2024-07 - Renovação de infraestrutura de rede e datacenter - Em andamento - (86%)
9. PS-STI-2025-01 - Implantação do processo de gestão e fiscalização dos contratos de TI com foco na gestão de riscos- Em andamento - (25%)



CONCLUÍDOS

1. PS-STI-2024-15 - Treinamento PowerBI
2. PS-STI-2024-13 - Integração das bases de dados de Atividades da ESMPU
3. PS-STI-2024-10 - Implementação da Fitoteca
4. PS-STI-2024-18 - Aprimoramento do controle dos contratos de TI
5. PS-STI-2024-08 - Readequação e expansão da solução de balanceamento de carga e tratamento de dados
6. PS-STI-2024-06 - Contratação dos Certificados Digitais
7. PS-STI-2023-15 - Contratação do ORACLE



SERVIÇOS STI



PORTAL DE
SERVICOS



ESMPU
digital

sei!

SISTEMA
ELETRÔNICO DE
INFORMAÇÕES





MICROSOFT
PROJECT



BI GESTÃO
DE PROJETOS

Contratações - STI

2T25: ABRIL A JUNHO DE 2025

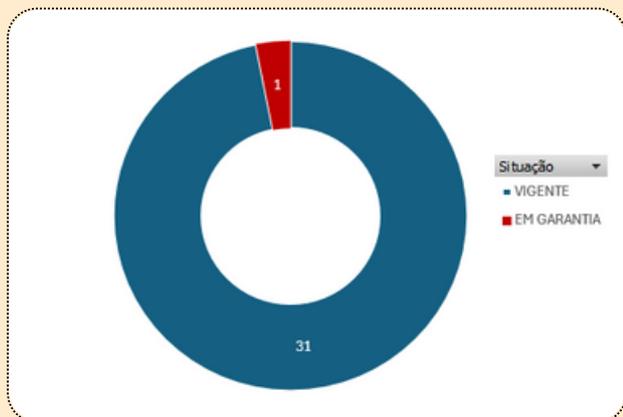

Atualmente, a STI possui um total de 32 contratos, que abrangem tanto contratos vigentes quanto contratos em período de garantia. Conforme ilustrado na figura à esquerda, a distribuição percentual é composta por 97% de contratos vigentes e 3% de contratos em garantia.

A figura à direita apresenta a distribuição dos contratos de TI agrupados por categoria. Observa-se que a maior parte dos contratos está concentrada na área de redes e segurança, que responde por 56,25% do total, com 18 contratos.

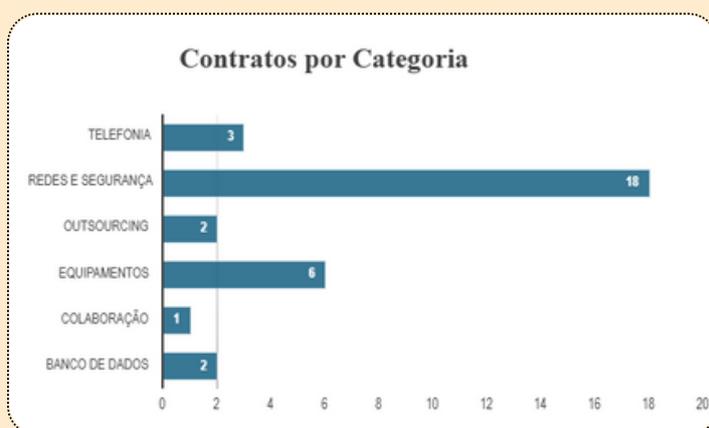


Figura 4 - Contratações em andamento

Pdti	Nº Processo Sei ↑	SEI DFD	Termo de Referência	Descrição Do Objeto	Categoria	Área Gestora	Progresso
PDTI 2024-2025	0.01.000.1.000582/2025-22	0560437		Novas licenças para solução de virtualização	REDES E SEGURANÇA	STI/DITI	EM ANDAMENTO
PDTI 2024-2025	0.01.000.1.000760/2025-66	0563223	0579128	Renovação do suporte e garantia da solução de Backup	REDES E SEGURANÇA	STI/DITI	EM ANDAMENTO
PDTI 2024-2025	0.01.000.1.002099/2024-97	0412564	0533362	PS-STI-2024-07 - Contratação dos Switches	REDES E SEGURANÇA	STI/DITI	EM ANDAMENTO
PDTI 2024-2025	0.01.000.1.002523/2024-95	0477394	0572197	Renovação do suporte e garantia da rede Wireless.	REDES E SEGURANÇA	STI/DITI	EM ANDAMENTO
PDTI 2024-2025	0.01.000.1.002524/2024-68	0477420	0560995	PS-STI-2024-19 - Implementação do novo NGFW	REDES E SEGURANÇA	STI/DITI	EM ANDAMENTO
PDTI 2024-2025	0.01.000.1.002782/2024-86	0510934	0581002	Renovação de suporte e garantia da telefonia fixa	TELEFONIA	STI/DISUP	EM ANDAMENTO

Principais Ações da STI

2T25: ABRIL A JUNHO DE 2025




Contratação e Implementação do novo Firewall

Modernizar a infraestrutura de segurança de redes, substituindo o firewall atual por uma solução mais robusta e moderna. Isso permitirá proteger dados sensíveis, assegurar o funcionamento estável dos recursos e mitigar os riscos crescentes de ataques cibernéticos.



Implantação do processo de gestão de riscos na contratações de TI

Mapear e implantar um processo estruturado de gestão e fiscalização dos contratos de Tecnologia da Informação (TI), com foco na identificação, monitoramento e mitigação de riscos, a fim de garantir o cumprimento e a entrega de resultados conforme o esperado.



Projeto Ensino Híbrido Unificado

Implementar melhorias no sistema acadêmico da ESMPU para viabilizar o cadastro unificado de atividades híbridas, ajustando processos como Plano de Atividades, matrícula, seleção e certificação, de modo a eliminar duplicidades, aumentar a eficiência operacional e aprimorar a organização das informações acadêmicas.



Projeto Atualização do SEI

Concessão do SEI é renovada. Em uso pela ESMPU desde 2017, o SEI passará por atualização da versão 3.1.2 para a mais recente, a 5.0. Assim, a atualização oferecerá importantes avanços em usabilidade, em segurança da informação e na experiência do usuário.

Deliberações

2T25: ABRIL A JUNHO DE 2025

PROJETOS E CONTRATOS DE TI



APROVAÇÃO



De acordo com o art. 4º, incisos II e III, da Portaria ESMPU nº 53/2022, que estabelece a competência do Comitê de TI (CTI) para "aprovar e monitorar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), em consonância com as diretrizes estratégicas do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) " e "priorizar os projetos previstos no PDTI, considerando a capacidade operacional da área de Tecnologia da Informação", o CTI aprova o planejamento dos projetos e as contratações de TI. Além disso, os projetos estão planejados e alinhados à estratégia da instituição, conforme preconiza os normativos.



Escola Superior do
Ministério Público da União



2T - 2025



ESMPU

FONTES DOS DADOS

Referências

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. Plano Diretor de Tecnologia da Informação da ESMPU 2022-2023 (PDTI 2022-2023). Disponível em: <https://escola.mpu.mp.br/a-escola/legislacao-e-regulamentos/pdti>. Acesso em: 9 jul. 2025.

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. Relatórios Consolidados de Execução do PDTI. Disponível em: <https://escola.mpu.mp.br/a-escola/legislacao-e-regulamentos/pdti>. Acesso em: 7 jul. 2025.

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. Plano de Desenvolvimento Institucional 2025-2029 (PDI 2025-2029). Disponível em: <https://escola.mpu.mp.br/a-escola/legislacao-e-regulamentos/pdi/pdi/pdi-2025-2029.pdf>. Acesso em: 7 jul. 2025.

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. Site institucional. Disponível em: <https://escola.mpu.mp.br/>. Acesso em: 9 jul. 2025.

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. Secretaria de Tecnologia da Informação. Relatório Portfólio de Projetos no Power BI. Disponível em: <https://app.powerbi.com/reportEmbed?reportId=efeb1057-fa6d-427e-948e-8dbf865e1baa&autoAuth=true&ctid=467723cd-15e9-4a8b-8f86-4992ed50b360>

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. Secretaria de Tecnologia da Informação. Sistema de Controle de Contratos de TI. Disponível em: <https://apps.escola.mpu.mp.br/ords/r/adm/controlecontrato/login>. Acesso em: 9 jul. 2025.
