

Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI

Relatório de Execução - 1º Semestre de 2026 – 1S26

2026 – 2027

Aprimorando saberes, fortalecendo direitos

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

Raquel Branquinho Pimenta Mamede Nascimento

Diretora-Geral

Manoel Jorge E Silva Neto

Diretor-Geral Adjunto

Renata Souza Mendes Salgueiro

Secretária de Ensino, Pesquisa e Extensão

Graziane Madureira

Secretária de Comunicação

Renata de Souza Rodrigues

Secretária de Administração

Vinícius dos Santos Moreira

Secretário de Tecnologia da Informação

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Genésio Ramos Neto

Assessor Técnico de TI

Adenilson dos Santos Chaves

Coordenador de Dados e Projetos de TI

Marcos Mello Nóbrega Soares

Coordenador de Sistemas de TI

Arley Pinheiro Lima Mendes

Coordenador de Infraestrutura de TI

Wesley de Jesus Silva

Coordenador de Suporte ao Usuário de TI

Sumário

Introdução	4
Projetos de TI	4
Replanejamento e cancelamento de projetos	8
Contratos de TI	9
Anexo 1- Projetos de TI	11

Introdução

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 2026-2027 da ESMPU orienta o planejamento, a gestão e o acompanhamento das iniciativas de Tecnologia da Informação, alinhando os recursos tecnológicos às necessidades institucionais. O plano foi aprovado por meio do Processo 0.01.000.1.000704/2026-23 e tem sua execução monitorada pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI).

Os Objetivos Estratégicos de Tecnologia da Informação (OETI) orientam a atuação da STI e asseguram o alinhamento entre os investimentos em tecnologia e as necessidades da ESMPU. Esses objetivos buscam ampliar a geração de valor institucional por meio da inovação, da melhoria dos processos, da gestão da informação e da segurança tecnológica.


Nesse contexto, a estratégia de TI está estruturada em seis eixos: apoio à educação e pesquisa por meio de soluções tecnológicas inovadoras; gestão da informação como ativo estratégico; otimização dos processos internos de TI; modernização da infraestrutura e dos sistemas; fortalecimento da segurança e confiabilidade dos serviços; e desenvolvimento de competências e da cultura digital. Esses eixos direcionam a priorização dos projetos e a aplicação dos recursos previstos no PDTI.

Com o objetivo de promover transparência e apoio à governança, a STI realiza o acompanhamento periódico dos projetos, contratos, indicadores e demais ações previstas no PDTI. Este relatório apresenta os principais resultados e a evolução das iniciativas executadas no primeiro semestre de 2026.

Projetos de TI

A distribuição quantitativa das iniciativas por situação de execução encontra-se ilustrada na Figura 1. Especificamente na revisão referente ao primeiro semestre de 2026 (1S26), o monitoramento contabiliza um total de **30 projetos**, dos quais 11 (36,67%) estão em andamento, 3 (10%) foram concluídos e 16 (53,33%) encontram-se a iniciar.

Figura 1 – Situação dos projetos

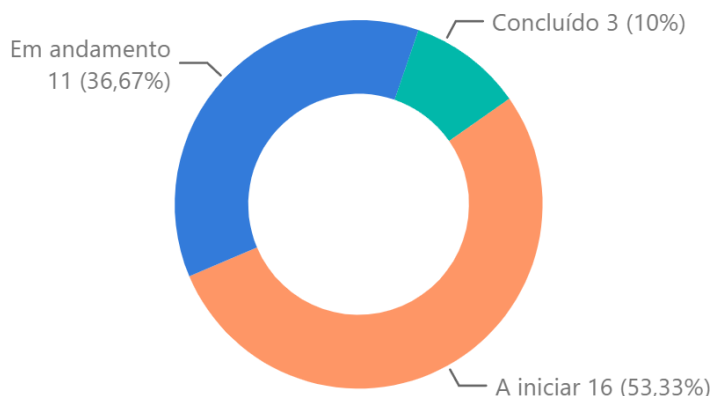

As ações classificadas na situação **em andamento** referem-se àquelas que já foram iniciadas, com cronograma estabelecido, equipes alocadas e que se encontram em plena execução.

O acompanhamento dessas ações segue a sistemática de monitoramento contínuo e revisões periódicas, visando à mitigação de riscos operacionais e à máxima eficiência na prestação dos serviços tecnológicos.

Abaixo, as informações dos projetos.

Tabela 1 – Projetos em andamento

Projeto	Gerente	Início	Conclusão	Progresso
PS-STI-2026-04 - Adesão à Rede CAFé	Roseliza Honda	12/11/25	12/08/26	99%
PS-STI-2026-08 - Implantação Intune	Arley Mendes	29/01/26	14/05/26	67%
PS-STI-2026-13 - Implantação de novas licenças do VMWare	Arley Mendes	01/04/26	30/07/26	64%
PS-STI-2026-31 - Nova Stack DevSecOps	Genésio Neto	05/03/26	31/07/26	64%
PS-STI-2026-02 - Desenvolvimento de interfaces para trilha de aprendizagem	Marcos Soares	22/01/26	26/06/26	50%
PS-STI-2026-03 - BI Orçamentário	Adenilson Chaves	13/01/26	26/08/26	46%
PS-STI-2026-16 - Programa de Formação Continuada em TI	Roseliza Honda	20/07/26	30/06/27	22%
PS-STI-2026-07 - Atualização da tecnologia do portal de serviços técnicos	Dinaldo Junior	29/01/26	21/08/26	18%
PS-STI-2026-01 - Sistema de Registro Acadêmico	Genésio Neto	13/01/26	18/12/26	12%
PS-STI-2026-06 - Estudo técnico do modelo de serviço de suporte aos usuários	Wesley Silva	29/01/26	30/09/26	10%
PS-STI-2026-10 - Automações em Diárias e Passagens	Adenilson Chaves	01/07/26	05/11/26	9%

Além da continuidade das ações já em andamento, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 2026-2027 estabelece o portfólio de projetos a iniciar. A seguir, apresenta-se a relação das iniciativas **a iniciar** previstas.

Tabela 2 – Projetos a iniciar

Projeto	Gerente	Início	Conclusão
PS-STI-2026-05 - Estudo técnico da contratação e implantação da telefonia IP	Anderson Costa	03/08/26	30/09/26
PS-STI-2026-17 - Gestão da configuração dos recursos de TI	Rodrigo Pinto	03/08/26	03/02/27
PS-STI-2026-15 - Projeto Pedagógico Institucional	Genésio Neto	01/09/26	17/02/27
PS-STI-2026-18 - Matrícula Digital	Roseliza Honda	01/10/26	20/09/27
PS-STI-2026-12 - Workshop para gestores negociais de sistemas	Roseliza Honda	01/10/26	31/12/26
PS-STI-2026-14 - Programa de Residência em TI	Roseliza Honda	11/01/27	30/09/27
PS-STI-2026-19 - Certificação Digital de pós-graduação	Marcos Soares	11/01/27	31/03/27
PS-STI-2026-20 - Nova solução de antivírus	Rodrigo Pinto	11/01/27	08/10/27
PS-STI-2026-21 - Reformulação do Firewall de Aplicação (F5)	Rodrigo Pinto	11/01/27	08/04/27
PS-STI-2026-24 - Evolução do Espaço Docente	Roseliza Honda	01/04/27	30/09/27
PS-STI-2026-23 - Espaço discente 2.0	Roseliza Honda	01/04/27	01/04/27
PS-STI-2026-25 - Geração automática de Editais Acadêmicos	Genésio Neto	01/07/27	30/09/27
PS-STI-2026-27 - Banco de dados da gestão do conhecimento	Dinaldo Junior	01/07/27	31/12/27
PS-STI-2026-26 - Sistema de Avaliação Institucional	Marcos Soares	01/07/27	01/07/27
PS-STI-2026-29 - Acesso unificado aos sistemas da ESMPU	Douglas Aguiar	01/07/27	31/12/27
PS-STI-2026-30 - Integração entre agendas do PA e Reserva de Espaços	Marcos Soares	01/10/27	31/12/27

Além dos projetos em andamento e a iniciar, este acompanhamento exhibe dados dos projetos concluídos, para exhibir, por completo, as ações desempenhas no âmbito da STI neste primeiro semestre de 2026.

Tabela 3 – Projetos concluídos


Projeto	Gerente	Início	Conclusão
PS-STI-2026-09 - Nova infraestrutura de operação dos sistemas SEI	Rodrigo Pinto	29/01/26	26/06/2026
PS-STI-2026-22 - Nova gerência de infraestrutura	Arley Mendes	29/01/26	01/07/2026
PS-STI-2026-11 - Formulário de Requisição de Direitos do Titular de Dados Pessoais	Adenilson Chaves	01/04/26	01/07/2026

Quanto ao acompanhamento do portfólio do PDTI 2026-2027, a consolidação dos dados de monitoramento revela a atual situação das iniciativas do portfólio. Nesse sentido, a aferição do primeiro semestre demonstra que o percentual consolidado de execução das ações planejadas atingiu o patamar de **26% de conclusão**.

Para fins de transparência e prestação de contas, o detalhamento das informações que compõem os projetos de TI encontra-se disponibilizado no **Anexo 1** do presente documento. O progresso individual de cada projeto e as respectivas entregas refletem o esforço institucional.

Assim, a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) reforça o compromisso com o monitoramento contínuo das atividades e projetos de TI. Desse modo, busca-se garantir que as fases subsequentes avancem em estrita conformidade com os cronogramas estipulados, viabilizando o cumprimento integral das metas estratégicas projetadas para o biênio 2026-2027.

Figura 2 - Distribuição de projetos por categoria



Replanejamento e cancelamento de projetos

A governança efetiva do portfólio de Tecnologia da Informação pressupõe não apenas um planejamento rigoroso, mas também a capacidade de adaptação frente a dinâmicas institucionais e tecnológicas. Nesse sentido, durante o ciclo de execução do PDTI, é natural que ocorram contingências, sejam elas de ordem orçamentária, técnica, regulatória ou estratégica, que demandem revisões no portfólio de projetos.

Diante de eventuais desvios nas características do projeto ou necessidade de alteração de escopo, de prazo ou de equipe aciona-se o mecanismo de replanejamento. A Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), por meio de suas instâncias de gestão, realiza uma análise de impacto técnico e operacional para readequar as metas, os prazos e a alocação de recursos. Esse procedimento visa garantir a viabilidade da entrega sem comprometer a qualidade da solução, mantendo o estrito alinhamento com as prioridades do órgão.

Além disso, em situações nas quais um projeto perde sua viabilidade técnica, seu respaldo financeiro ou a sua convergência com os objetivos estratégicos da ESMPU, procede-se ao cancelamento da iniciativa. Essa medida de racionalização atua como um mecanismo de salvaguarda, evitando o desperdício

de recursos públicos e de força de trabalho em soluções que se tornaram obsoletas ou injustificáveis antes de sua conclusão.

A Tabela 4 detalha os projetos submetidos a replanejamento no presente ciclo (primeiro semestre de 2026), bem como as justificativas para as iniciativas canceladas ou replanejadas.

Tabela 4 – Projetos incluídos, cancelados e reprogramados

Projeto	Situação	Justificativa
PS-STI-2026-22 -Nova gerência de infraestrutura	Reprogramado de 1T27 para 1T26	Antecipado de 1T27 por necessidade de melhoria no acompanhamento das transmissões de eventos ao vivo e de ensino híbrido.
PS-STI-2026-12 - Workshop para gestores negociais de sistemas	Reprogramado de 2T26 para 4T26	Workshop a ser tratado em edições futuras da semana de capacitação interna de 2027.
PS-STI-2026-14 - Programa de Residência em TI	Reprogramado de 2T26 para 1T27	Adiado por impossibilidade de realização de processo seletivo em 2026 em conjunto com a PGR.
PS-STI-2026-28 -Estudo técnico para infraestrutura de containers	Cancelado	Escopo absorvido pelo novo projeto PS-STI-2026-31 - Implantação do modelo DevSecOps
PS-STI-2026-31 -Nova Stack DevSecOps	Novo	Necessidade estratégica de transformação do ambiente tecnológico de desenvolvimento e operação de serviços de TI que viabilizasse o portfólio em andamento
PS-STI-2026-05 - Estudo técnico da contratação e implantação da telefonia IP	Reprogramado de 1T26 para 3T26	Adiado por repriorização após revisão do PCA2026

Contratos de TI

As contratações de Secretaria de Tecnologia da Informação - (STI) representam um componente crítico para a viabilidade dos objetivos estratégicos do PDTI. Mais do que meras aquisições de ativos ou serviços, elas configuram empreendimento estruturante que demanda planejamento rigoroso para assegurar

a máxima eficiência e a economicidade na aplicação dos recursos públicos. Cada processo de contratação deve originar-se de uma necessidade institucional fundamentada, pautando-se pelo alinhamento com as diretrizes de governança corporativa.

Para o exercício de 2026, destacam-se os principais objetos previstos para contratação ou renovação que compõem o escopo de atuação da TI:

Tabela 5 – Contratos em andamento

SEI			Objeto	Categoria	Gestor	Progresso	Valor Global Estimado	Ano PCA
Processo	DFD	TR						
0.01.000.1.000982/2026-83	0659036	0662380	Contratação de fitas de backup	REDES E SEGURANÇA	COINFRA	EM ANDAMENTO	R\$ 37.686,00	2026
0.01.000.1.000750/2026-42	0653101	0652877	Novas licenças para solução de virtualização	REDES E SEGURANÇA	COINFRA	CONTRATADO	R\$ 1.674.358,20	2025
0.01.000.1.001655/2026-51	0680608	0680967	Contratação de cursos de formação em administração de banco de dados Oracle	Capacitação	CODAP	EM ANDAMENTO	R\$ 14.400,00	2026
0.01.000.1.001796/2026-27	0685900	0686174	Contratação de cursos de gestão e orquestração de containers com Docker e Kubernetes	Capacitação	COINFRA	EM ANDAMENTO	R\$ 6.061,00	2026
0.01.000.1.001807/2026-21	0686215	0686216	Contratação de curso de gerência de centro de suporte "Support Center Manager", promovido pela HDI Brasil	Capacitação	COSUP	EM ANDAMENTO	R\$ 3.128,35	2026
0.01.000.1.001474/2026-88	0675999	0676016	Contratação de treinamento de AppSec, Secure Coding and DevSecOps	Capacitação	COSIS	CONTRATADO	R\$ 17.500,00	2026

Por fim, a consolidação das contratações reflete o esforço rigoroso de racionalização dos gastos públicos. Cada item elencado é submetido às normas de contratação pública estritamente necessárias para suportar a continuidade e a inovação dos serviços da ESMPU, evitando a ociosidade de recursos e garantindo a máxima transparência.

Anexo 1- Projetos de TI

Projeto	OETI	Situação	Gerente	Início	Conclusão	Progresso
PS-STI-2026-04 - Adesão à Rede CAFé.	OETI3	Em andamento	Roseliza Honda	12/11/25	12/08/2026	99%
PS-STI-2026-01 - Sistema de Registro Acadêmico	OETI1	Em andamento	Genésio Neto	13/01/26	18/12/2026	12%
PS-STI-2026-03 - BI Orçamentário	OETI2	Em andamento	Adenilson Chaves	13/01/26	26/08/2026	46%
PS-STI-2026-02 - Desenvolvimento de interfaces para trilha de aprendizagem	OETI1	Em andamento	Marcos Soares	22/01/26	26/06/2026	50%
PS-STI-2026-06 - Estudo técnico do modelo de serviço de suporte aos usuários	OETI3	Em andamento	Wesley Silva	29/01/26	30/09/2026	10%
PS-STI-2026-08 - Implantação Intune	OETI5	Em andamento	Arley Mendes	29/01/26	14/05/2026	67%
PS-STI-2026-07 - Atualização da tecnologia do portal de serviços técnicos	OETI4	Em andamento	Dinaldo Junior	29/01/26	21/08/2026	18%
PS-STI-2026-31 - Nova Stack DevSecOps	OETI1	Em andamento	Genésio Neto	05/03/26	31/07/2026	68%
PS-STI-2026-13 - Implantação de novas licenças do VMWare	OETI4	Em andamento	Arley Mendes	01/04/26	30/07/2026	64%
PS-STI-2026-10 - Automações em Diárias e Passagens	OETI3	Em andamento	Adenilson Chaves	01/07/26	05/11/2026	9%
PS-STI-2026-16 - Programa de Formação Continuada em TI	OETI6	Em andamento	Roseliza Honda	20/07/26	30/06/2027	22%
PS-STI-2026-22 - Nova gerência de infraestrutura	OETI3	Concluído	Arley Mendes	29/01/26	01/07/2026	100%
PS-STI-2026-09 - Nova infraestrutura de operação do sistemas SEI	OETI4	Concluído	Rodrigo Pinto	29/01/26	26/06/2026	100%
PS-STI-2026-11 - Formulário de Requisição de Direitos do Titular de Dados Pessoais	OETI3	Concluído	Adenilson Chaves	01/04/26	01/07/2026	100%
PS-STI-2026-05 - Estudo técnico da contratação e implantação da telefonia IP	OETI3	A iniciar	Anderson Costa	03/08/26	30/09/2026	0%
PS-STI-2026-17 - Gestão da configuração dos recursos de TI	OETI3	A iniciar	Rodrigo Pinto	03/08/26	03/02/2027	0%
PS-STI-2026-15 - Projeto Pedagógico Institucional	OETI1	A iniciar	Genésio Neto	01/09/26	17/02/2027	0%
PS-STI-2026-18 - Matrícula Digital	OETI1	A iniciar	Roseliza Honda	01/10/26	20/09/2027	0%
PS-STI-2026-12 - Workshop para gestores negociais de sistemas	OETI6	A iniciar	Roseliza Honda	01/10/26	31/12/2026	0%

PS-STI-2026-14 - Programa de Residência em TI	OETI6	A iniciar	Roseliza Honda	11/01/27	30/09/2027	0%
PS-STI-2026-19 - Certificação Digital de pós-graduação	OETI1	A iniciar	Marcos Soares	11/01/27	31/03/2027	0%
PS-STI-2026-20 - Nova solução de antivírus	OETI5	A iniciar	Rodrigo Pinto	11/01/27	08/10/2027	0%
PS-STI-2026-21 - Reformulação do Firewall de Aplicação (F5)	OETI5	A iniciar	Rodrigo Pinto	11/01/27	08/04/2027	0%
PS-STI-2026-24 - Evolução do Espaço Docente	OETI1	A iniciar	Roseliza Honda	01/04/27	30/09/2027	0%
PS-STI-2026-23 - Espaço discente 2.0	OETI1	A iniciar	Roseliza Honda	01/04/27	01/04/2027	0%
PS-STI-2026-25 - Geração automática de Editais Acadêmicos	OETI1	A iniciar	Genésio Neto	01/07/27	30/09/2027	0%
PS-STI-2026-27 - Banco de dados da gestão do conhecimento	OETI3	A iniciar	Dinaldo Junior	01/07/27	31/12/2027	0%
PS-STI-2026-26 - Sistema de Avaliação Institucional	OETI1	A iniciar	Marcos Soares	01/07/27	01/07/2027	0%
PS-STI-2026-29 - Acesso unificado aos sistemas da ESMPU	OETI4	A iniciar	Douglas Aguiar	01/07/27	31/12/2027	0%
PS-STI-2026-30 - Integração entre agendas do PA e Reserva de Espaços	OETI1	A iniciar	Marcos Soares	01/10/27	31/12/2027	0%
Total						26%
